

COMUNE DI ORRIA



Provincia Di Salerno

Lavori di COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE

Progetto Definitivo - Esecutivo

Data	Elaborato	Sigla Elaborato
Giugno 2019	Layout Cantiere	Sic_02

Progettista

Ing. Angelo Gugliucci



IL SINDACO

Ing. Mauro Inverso

Il Collaudatore


L'ASSESSORE DELEGATO

L'impresa


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi
per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio*

FOTO AEREA
CON INDICAZIONE DEL FABBRICATO
OGGETTO DELL'INTERVENTO

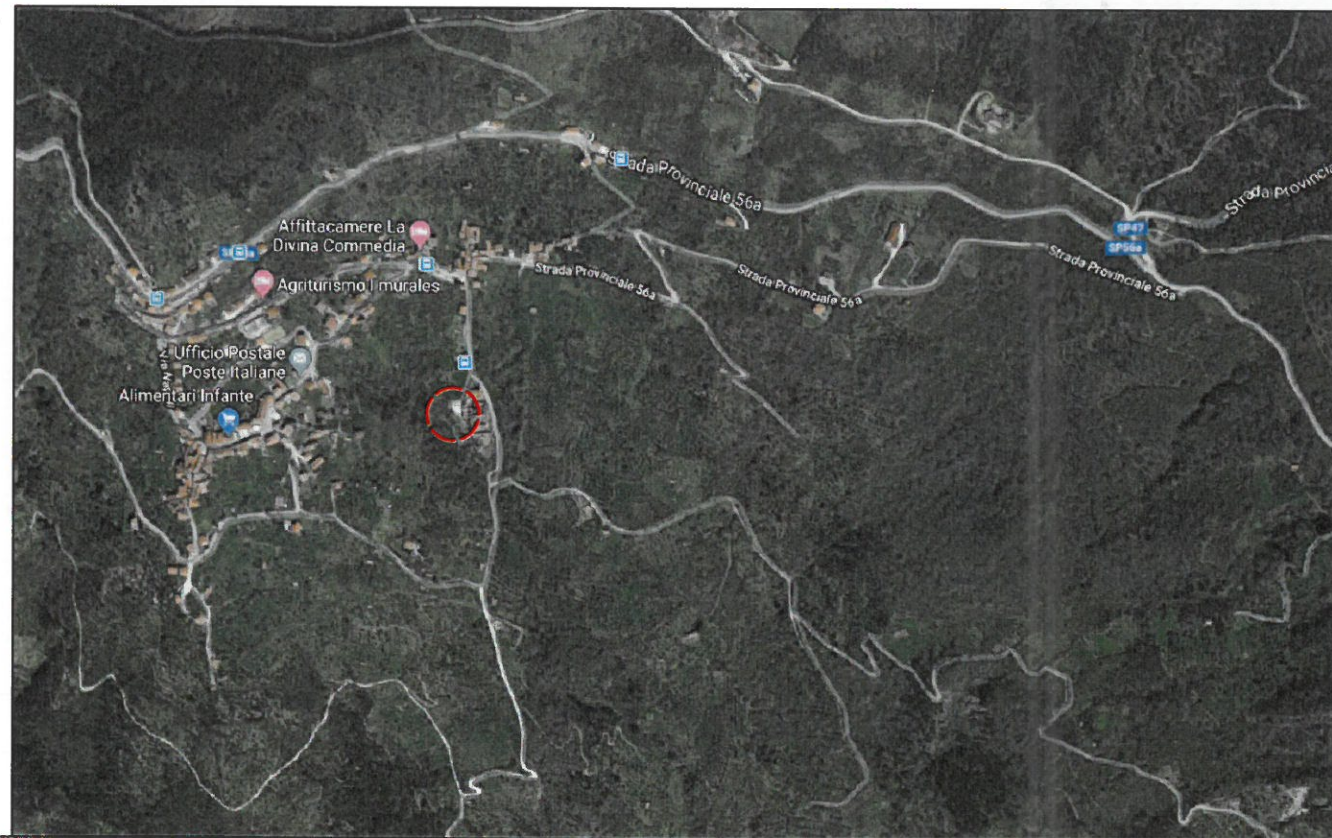

STRALCIO CATASTALE AREA DI INTERVENTO

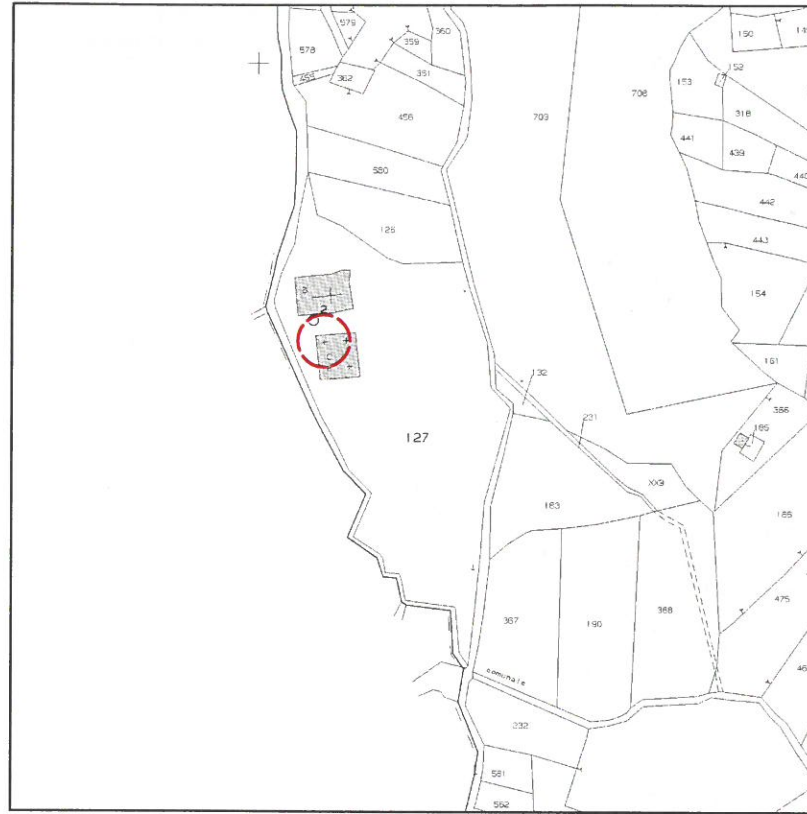


LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE CIMITERIALI A PIANO VETRALE


Foglio n. 18

Committenza:

Comune di Orria (Sa)

AEROFOTOGRAMMETRIA CON INDICAZIONE DEL LUOGO
OGGETTO DELL'INTERVENTO

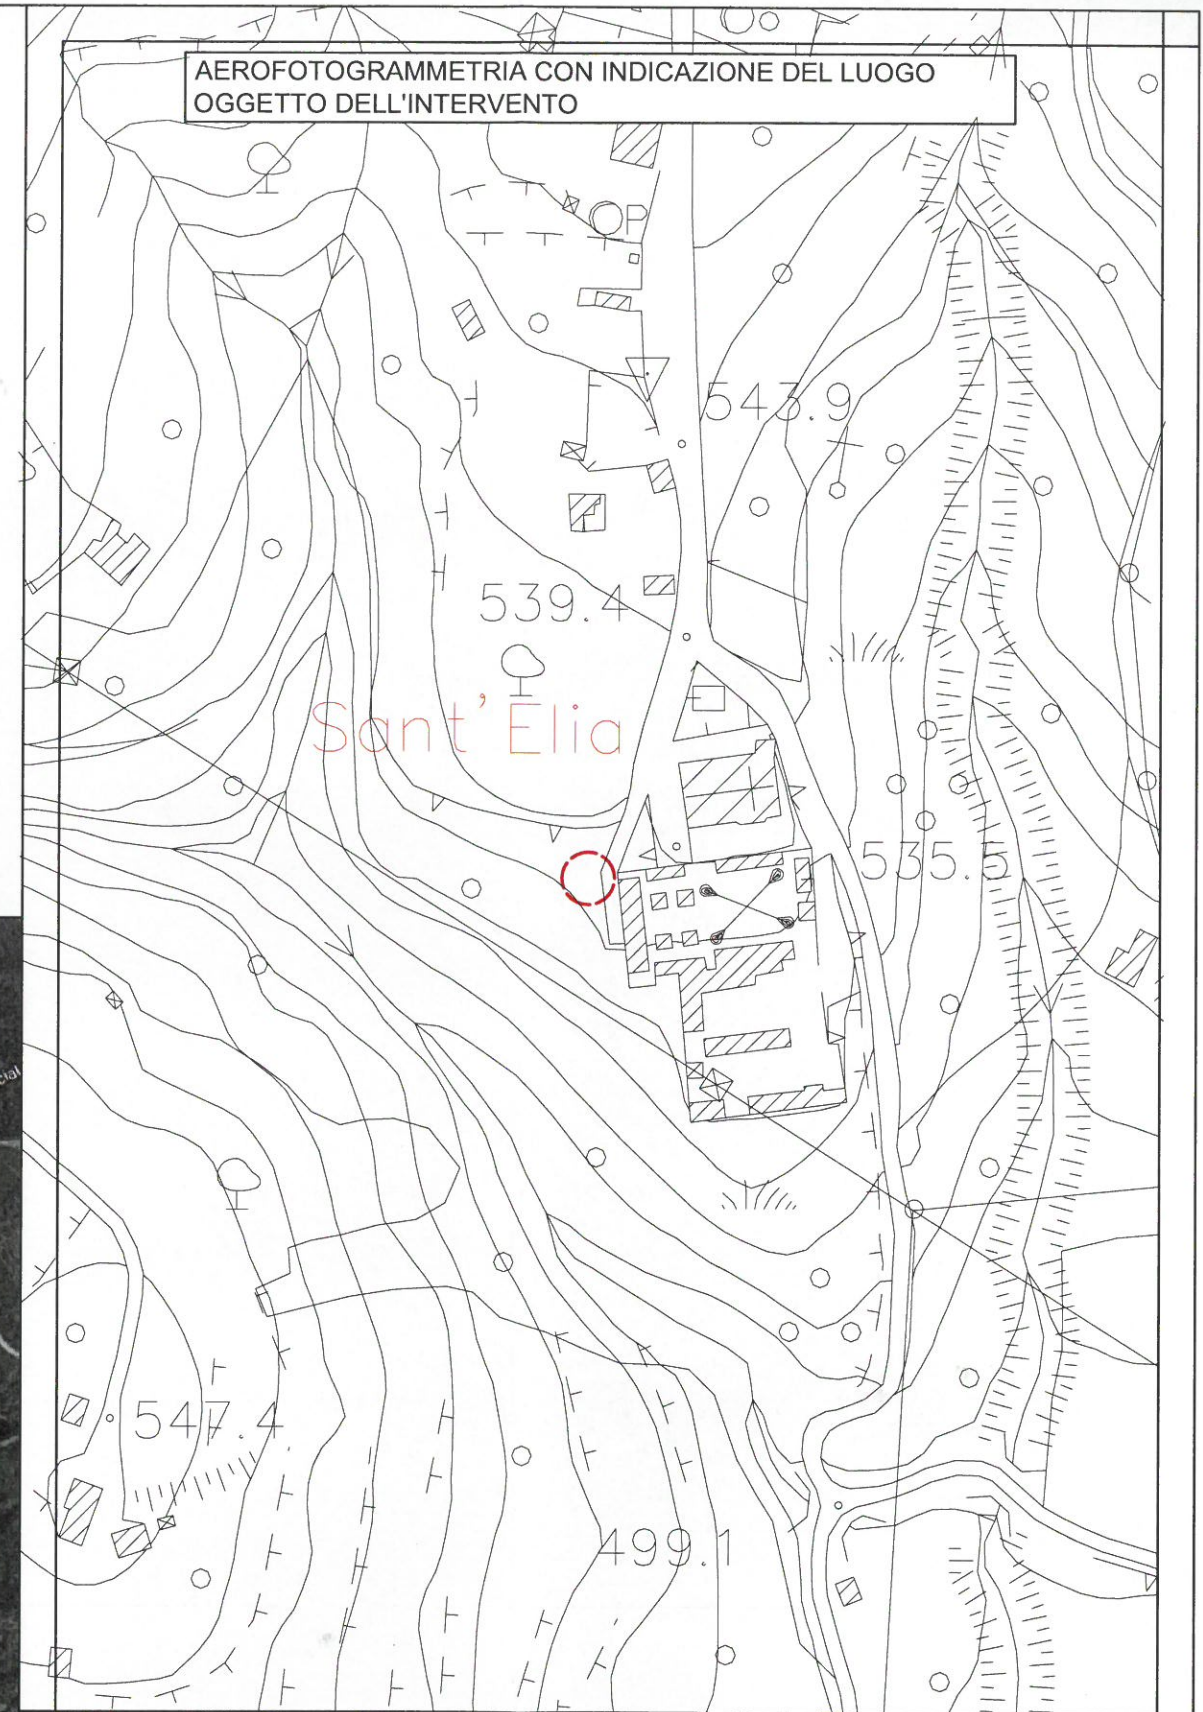

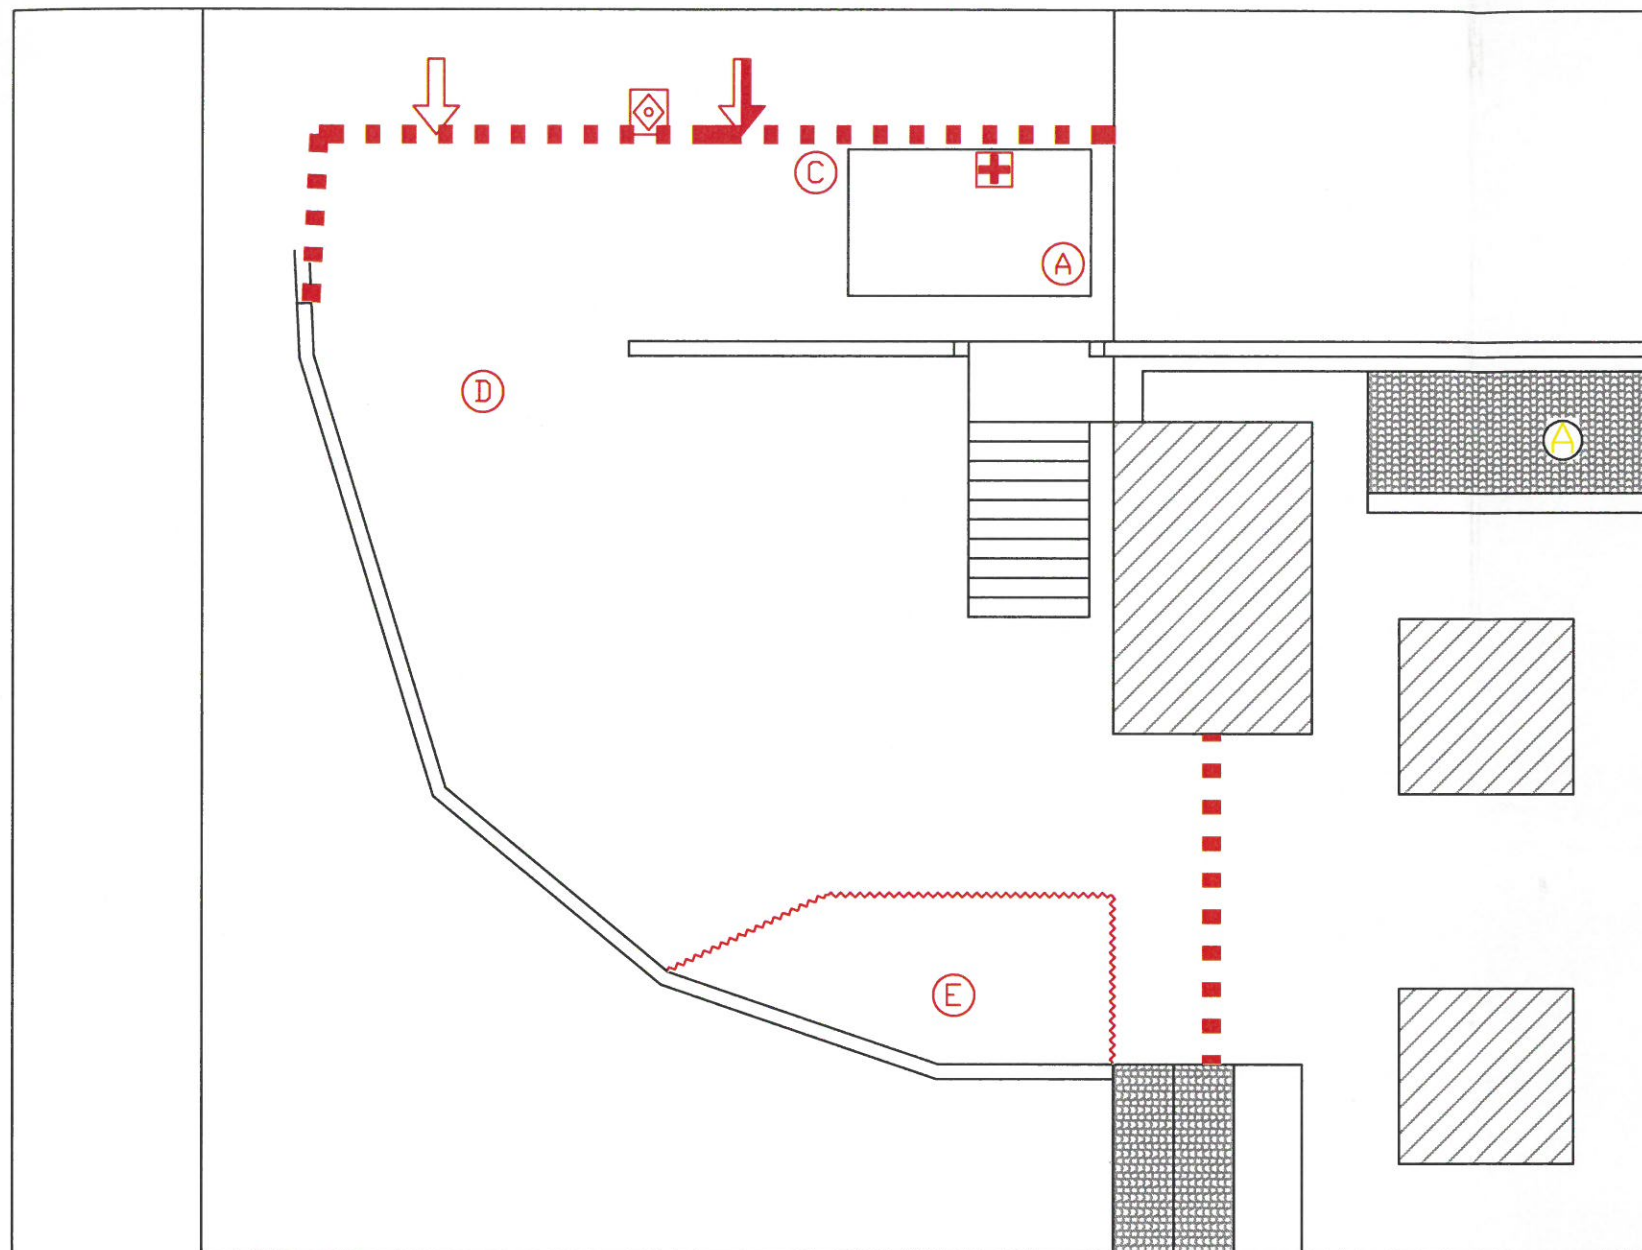

SICUREZZA



LEGENDA

--- Recinzione esterna

~~~~~ Recinzioni provvisorie

➡ Accesso pedonale

➡ Accesso carrabile

⛑ Cassette pronto soccorso

◊ cartelli di cantiere

- (A) Cabina con Bagno
- (B) Area di deposito materiale
- (C) Quadro elettrico di cantiere
- (D) Area di accesso ai mezzi
- (E) Stoccaggio provvisorio ponteggio



## ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

**Interconnessioni con altri lavori:** In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni.

**Modalità di esecuzione:** Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96.

**Attrezzature e macchinari:** Mazza, piccole, pala

**Materiali:** Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete

**Analisi dei rischi:** Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento, caduta dall'alto.

**Dispositivi di protezione individuali:** Casco, guanti, calzature di sicurezza, Imbracatura anticaduta.

**Riferimenti normativi:** D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 Integrato con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08

**Note:** L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.

## DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il presente piano riguarda la realizzazione di quarantotto loculi cimiteriali in area periferica senza interferenze significative.

- Il progetto prevede la realizzazione di 2 blocchi di 32 e 16 loculi rispettivamente.
- la struttura portante è in cemento armato.
- della copertura sarà realizzata in acciaio.

## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per dare corso alle lavorazioni previste non occorrono particolari attenzioni alla viabilità sia interna che esterna in quanto l'area non è transitata. Comunque è prevista la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni provvisorie interne per segnare le aree ad esclusivo utilizzo pedonale. Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere. In particolare dovrà essere prescelta l'ubicazione del baraccamento. Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra, verranno installati la linea elettrica ed il quadro elettrico di cantiere. Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera. L'Impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare l'effettiva stabilità e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico. Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei materiali da impiegare, dovranno essere individuate, l'area per il deposito temporaneo degli elementi del ponteggio e di quelli necessari alla realizzazione delle opere provvisorie oltre all'area per la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarica.

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE CIMITERIALI A PIANO VETRALE

Foglio n. 18

Committenza:

Comune di Orria (Sa)

